



MINISTERO DELLA  
TRANSIZIONE ECOLOGICA

---

# Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Stato di attuazione misure MiTE

SESTA RIUNIONE TAVOLO PERMANENTE PER IL PARTENARIATO ECONOMICO, SOCIALE E  
TERRITORIALE

Roma, 16 febbraio 2022

# Agenda

**PNRR MiTE: sintesi degli obiettivi e dello stato di attuazione**

**Focus Milestones & Targets UE: scadenze 2022**

# Obiettivi del MiTE tramite il PNRR



Accelerare e rendere l'Italia un campione globale della transizione ecologica

- **Rendere l'Italia più resiliente** agli inevitabili cambiamenti climatici
- **Rendere il sistema italiano più sostenibile** nel lungo termine garantendone la competitività
- **Sviluppare una *leadership* internazionale industriale e di *knowledge*** nelle principali filiere della transizione
- **Assicurare una transizione inclusiva ed equa**, massimizzando i livelli occupazionali e contribuendo alla riduzione del gap tra le Regioni
- **Aumentare consapevolezza e cultura** su sfide e tematiche ambientali

Misure PNRR fondamentali ma **parte di un più ampio portafoglio di incentivi e riforme da introdurre per raggiungere obiettivi 2030 e 2050**

# Vista di insieme di investimenti e riforme PNRR MiTE


Componente in M2

Investimenti PNRR MiTE<sup>1</sup>

Miliardi di euro, numero di iniziative

Riforme PNRR MiTE<sup>1</sup>

Numero di riforme

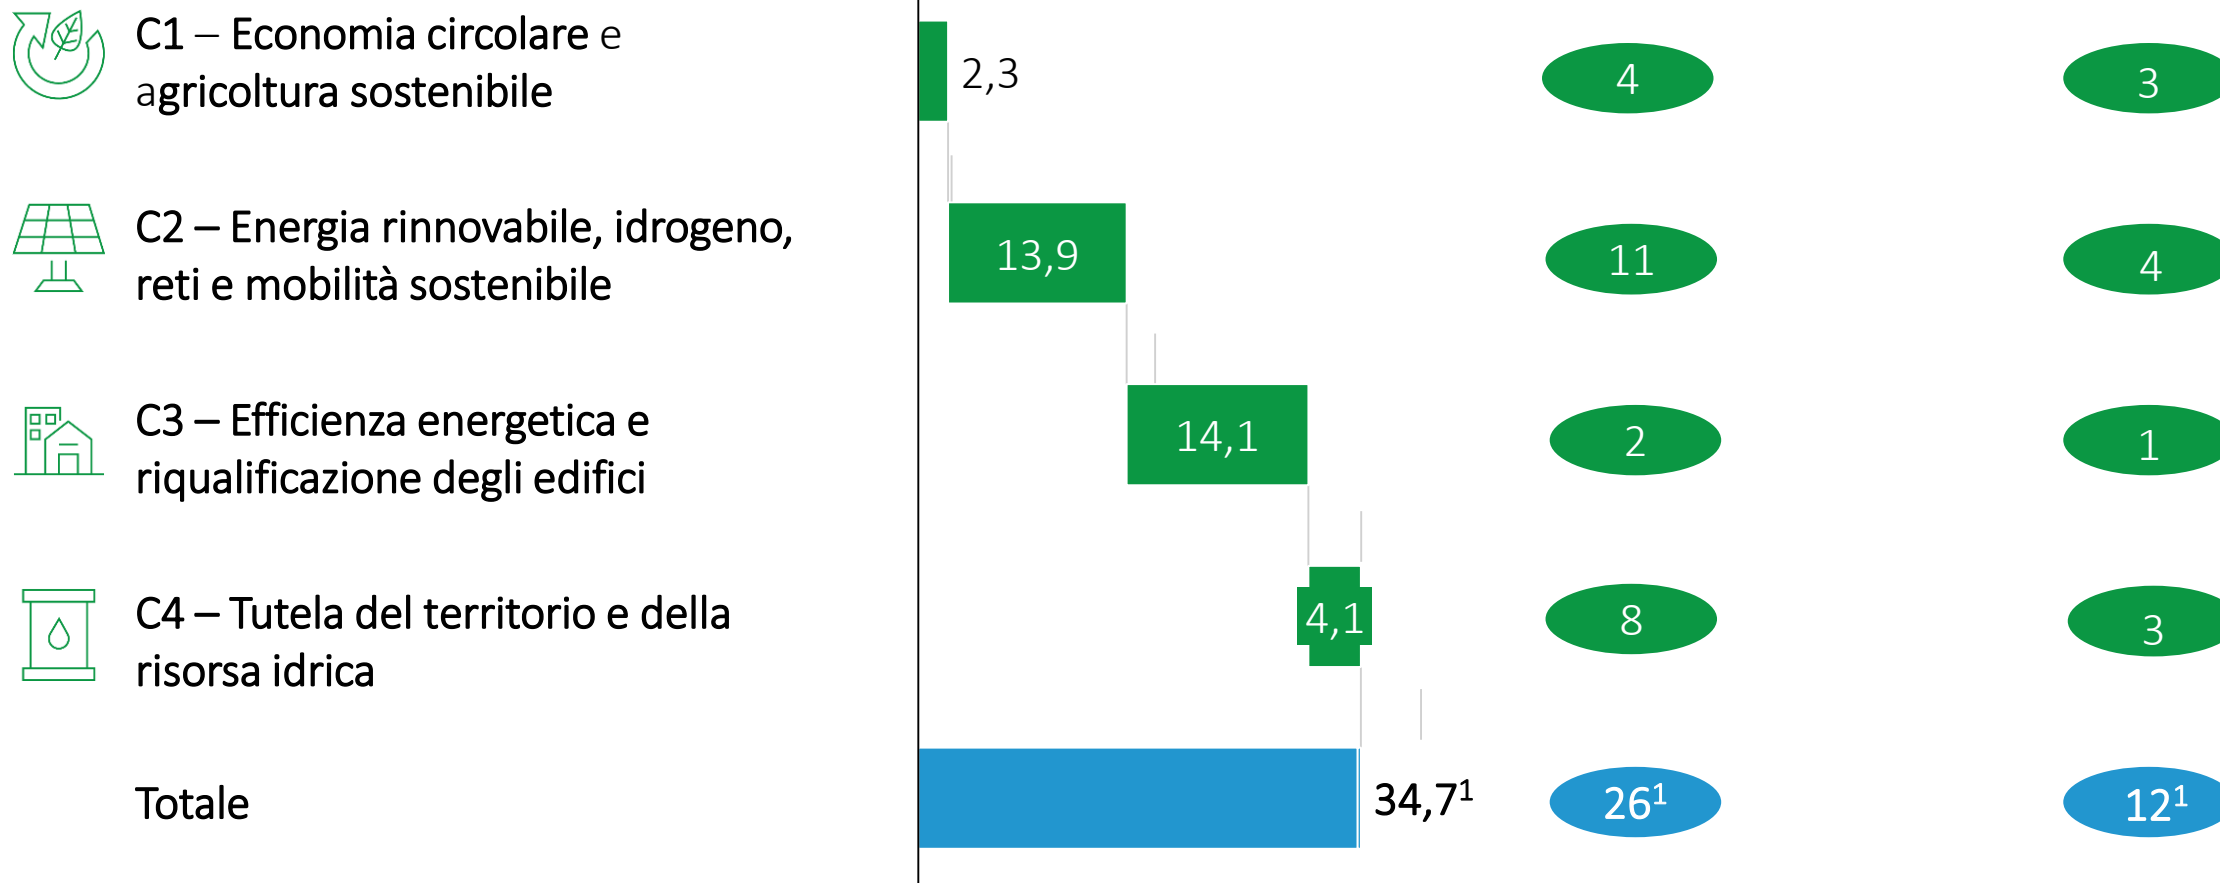

<sup>1</sup> include anche 1 investimento in M3 (Green Ports, 0,3M) e 1 riforma in M1 (CAM)

# Dettaglio di investimenti e riforme PNRR MiTE



## Investimenti titolarità MiTE, Miliardi di euro

1		1.1 Realizzazione nuovi <b>impianti di gestione rifiuti</b> e ammodernamento di impianti esistenti	1,50
2	C1	1.2 Progetti <b>"faro"</b> di economia circolare	0,60
3		3.1 <b>Isole verdi</b>	0,20
4		3.3 <b>Cultura e consapevolezza</b> su temi e sfide ambientali	0,03
5		1.1: Sviluppo <b>agro-voltaico</b>	1,10
6		1.2: Promozione rinnovabili per le <b>comunità energetiche</b> e l'auto-consumo	2,20
7		1.3: Promozione <b>impianti innovativi</b> (incluso off-shore)	0,68
8		1.4: Sviluppo <b>bio-metano</b>	1,92
9		2.1: Rafforzamento <b>smart grid</b>	3,61
10	C2	2.2: Interventi su <b>resilienza</b> climatica reti	0,50
11		3.1: Produzione <b>H2 in aree industriali</b> dismesse	0,50
12		3.2: Utilizzo <b>H2 in settori hard-to-abate</b>	2,00
13		3.5: <b>Ricerca e sviluppo</b> sull'idrogeno	0,16
14		4.3: Sviluppo infrastrutture di <b>ricarica elettrica</b>	0,74
15		5.2: <b>Idrogeno</b>	0,45
16	C3	2.1 <b>Ecobonus e Sismabonus</b> fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici	13,95
17		3.1 Sviluppo di sistemi di <b>teleriscaldamento</b>	0,20
18	C4	1.1 Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di <b>monitoraggio e previsione</b>	0,50
19		2.1a Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del <b>rischio idrogeologico</b>	1,29
20		3.1: Tutela e valorizzazione del <b>verde urbano ed extraurbano</b>	0,33
21		3.2: Digitalizzazione dei <b>parchi nazionali</b>	0,10
22		3.3: Rinaturazione dell'area del <b>Po</b>	0,36
23		3.4: Bonifica dei <b>siti orfani</b>	0,50
24		3.5: Ripristino e tutela dei <b>fondali e degli habitat marini</b>	0,40
25	4.4: Investimenti in <b>fognatura e depurazione</b>	0,60	
26	M3	1.1 Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports)	0,27
			<b>34,68</b>




## Riforme MiTE

1	M1	3.1: Adozione di <b>criteri ambientali minimi</b> per eventi cultural
2	C1	1.1 Strategia nazionale per l' <b>economia circolare</b>
3		1.2: Programma nazionale per la <b>gestione dei rifiuti</b>
4		1.3: Supporto tecnico alle <b>autorità locali</b>
5	C2	1.1: Semplificazione delle <b>procedure di autorizzazione</b> per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno
6		1.2: Nuova normativa per la promozione della <b>produzione e del consumo di gas rinnovabile</b>
7		3.1: Semplificazione amministrativa e riduzione degli <b>ostacoli normativi</b> alla diffusione dell' <b>idrogeno</b>
8		3.2: Misure volte a promuovere la <b>competitività dell'idrogeno</b>
9	C3	1.1: Semplificazione e accelerazione delle procedure per la realizzazione di interventi per l' <b>efficientamento energetico</b>
10	C4	2.1: Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il <b>dissesto idrogeologico</b>
11		3.1: Adozione di programmi nazionali di controllo dell' <b>inquinamento atmosferico</b>
12		4.2: Misure per garantire la piena capacità gestionale per i <b>servizi idrici integrati</b>

- Iniziative con **diversi obiettivi, beneficiari, strumenti**
- **Ulteriore ruolo MiTE** su altre iniziative per transizione ecologica a titolarità di altri Ministeri

# Percorso di Milestones e Targets UE delle misure PNRR MiTE

Esempi, non esaustivo

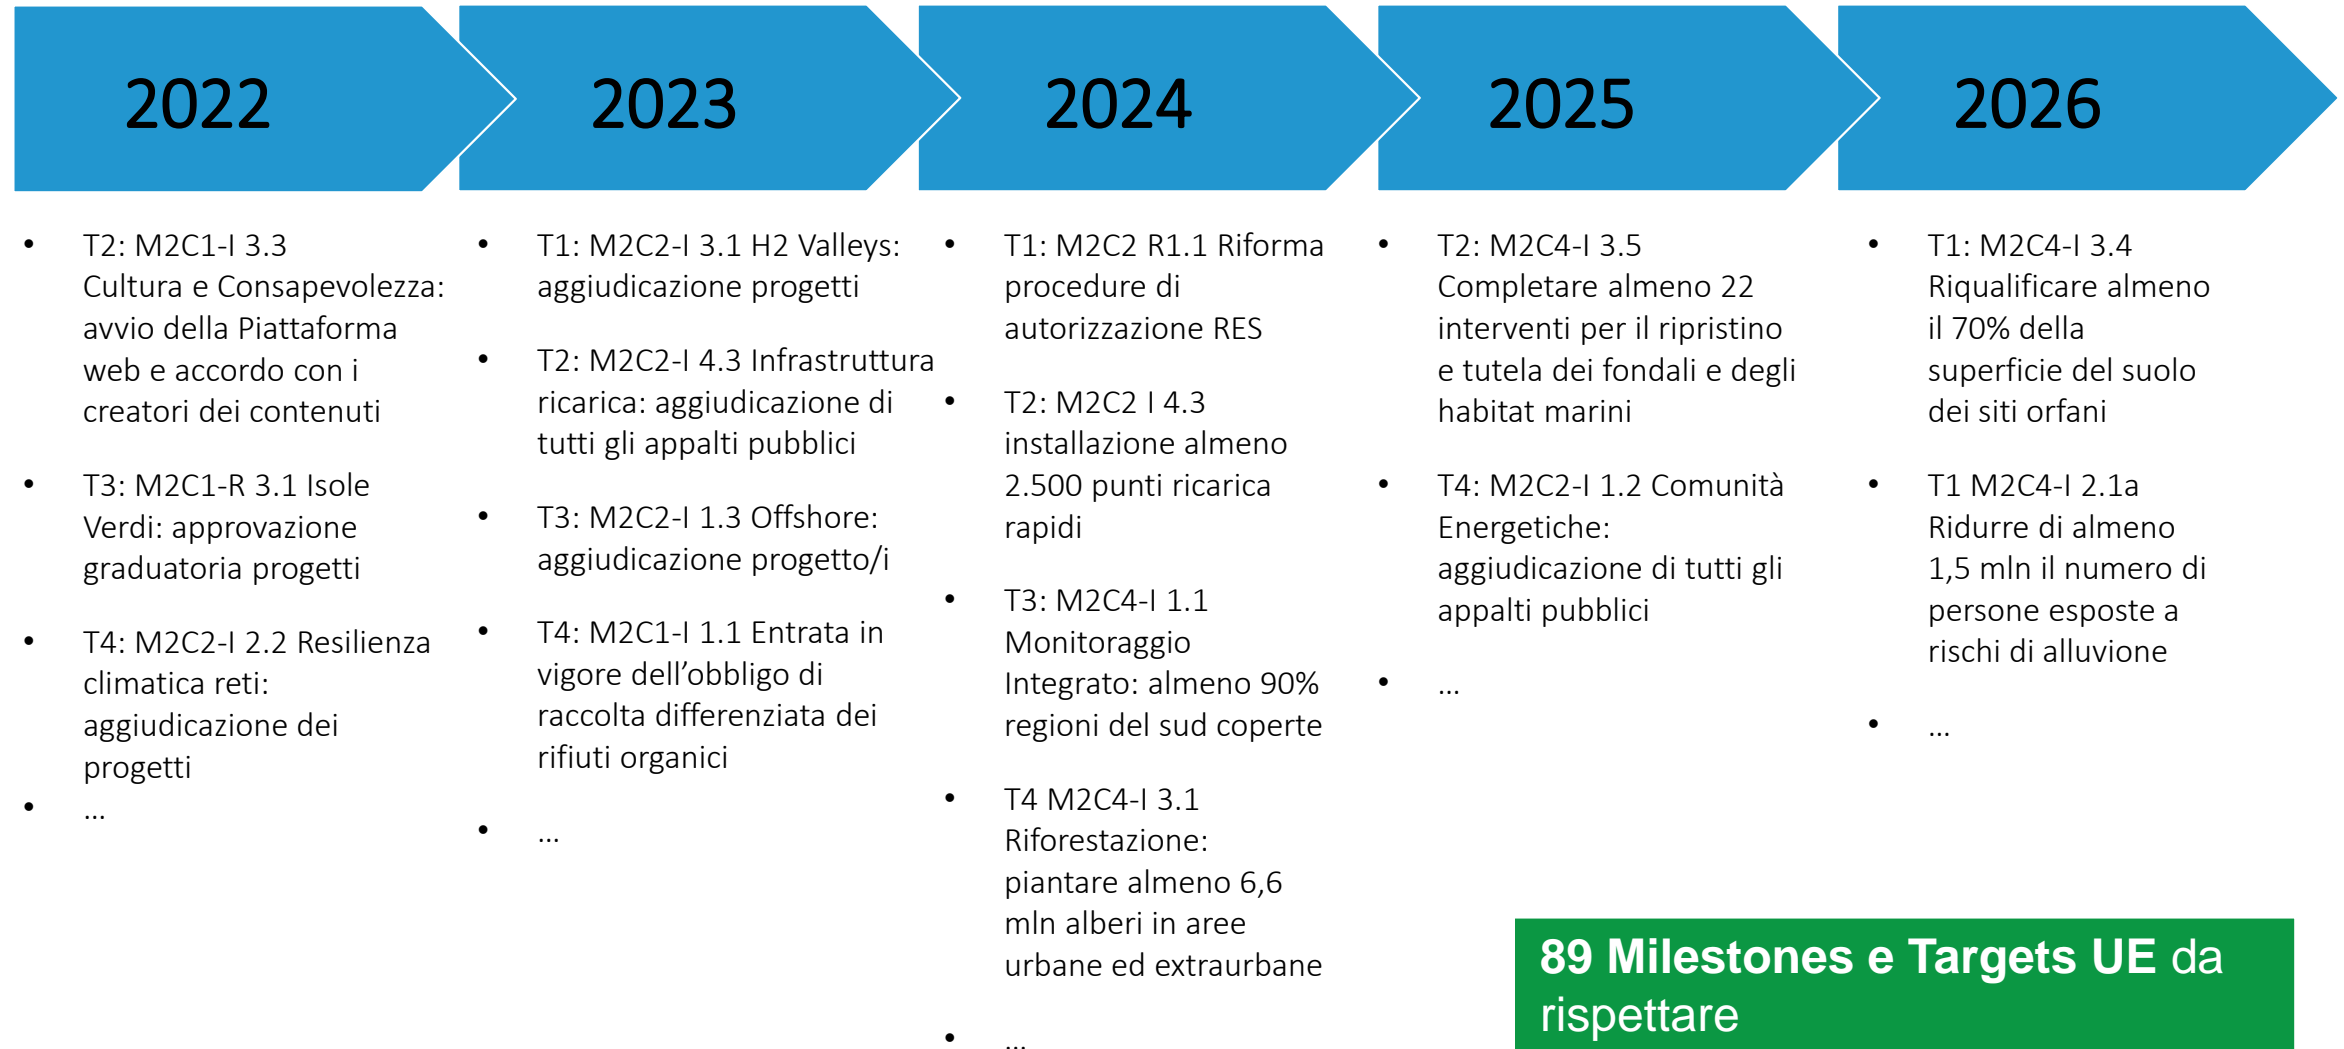

**89 Milestones e Targets UE da rispettare**

# Sintesi dell'avanzamento di Milestones e Targets misure PNRR MiTE

Status M&amp;T UE




Status M&amp;T ITA




Di cui 11 (7  
relativi a  
Riforme) nel  
prossimo  
semestre

(xx) di cui relativi a Riforme

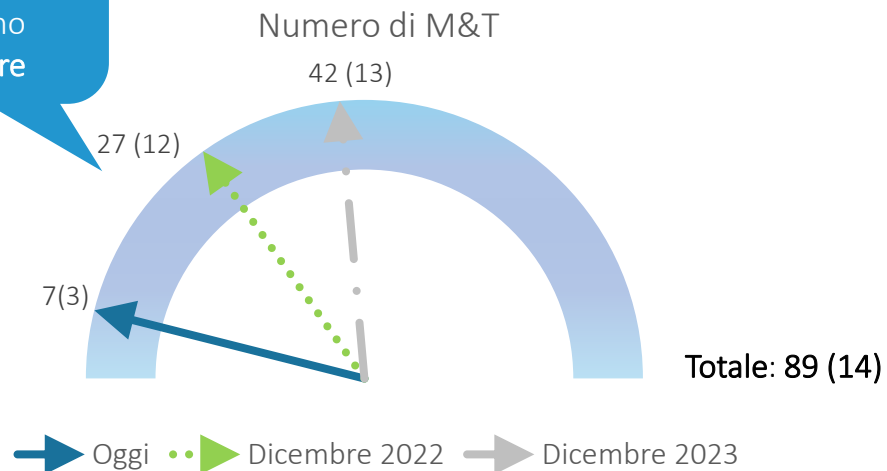

(xx) di cui relativi a Riforme

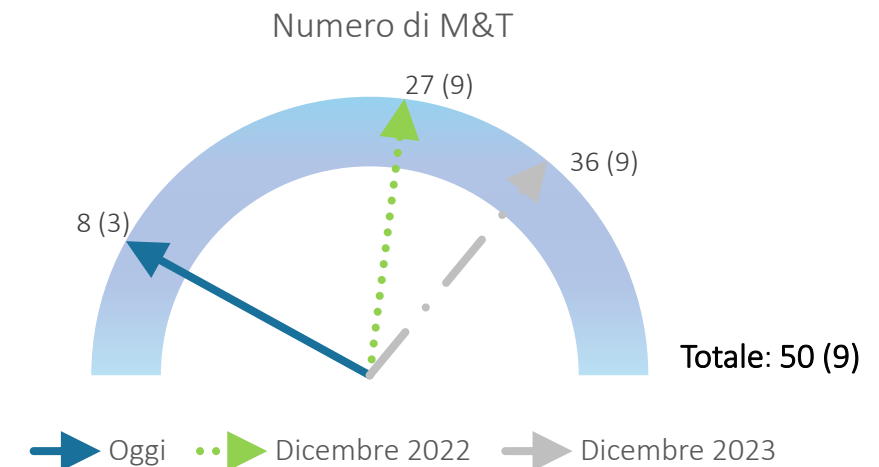

# Ulteriori azioni rilevanti a breve per gli obiettivi PNRR oltre M&T

Ulteriori misure PNRR in attivazione nei prossimi mesi non monitorate in M&T precedenti (Miliardi di euro)

Misure a supporto FER, MW

Aggiudicazione di bandi già in corso


2,57

- ✓ M2C1 1.1 'Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti' (1,5)
- ✓ M2C1 1.2: 'Progetti "faro" di economia circolare' (0,6)
- ✓ M2C1 3.1: 'Isole Verdi' (0,2)
- ✓ M3 1.1: 'Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports)' (0,27)

Bandi da emettere

9,86

- M2C2 1.1: 'Sviluppo Agrovoltaiico' (1,1)
- M2C2 1.1: 'Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo' (2,2)
- M2C2 1.4: 'Sviluppo del biometano' (1,92)
- M2C2 2.1: 'Rafforzamento smart grid' (3,61)
- M2C2 2.1: 'Interventi su resilienza climatica reti' (0,5)
- M2C3 3.1: 'Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento' (0,2)
- M2C4 3.1: 'Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano' (0,33)

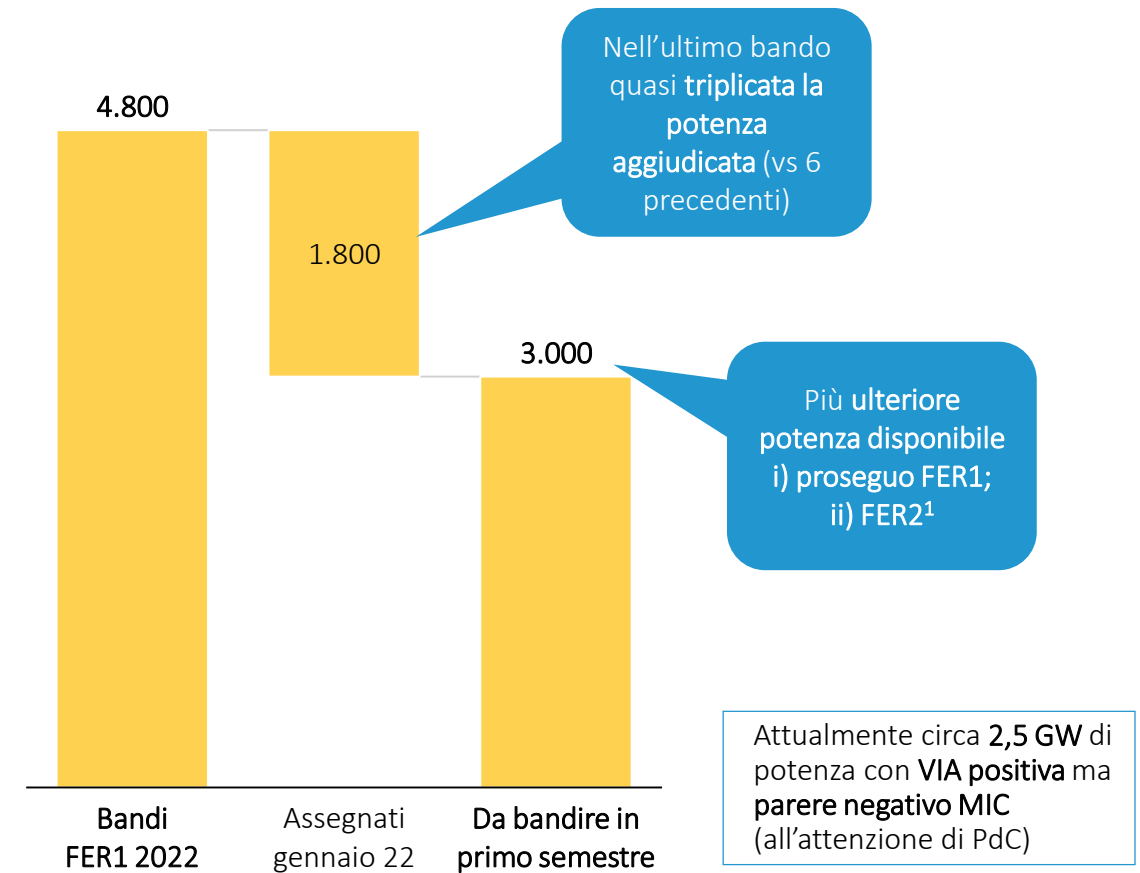

<sup>1</sup> FER 2 prevede 3900 MW su 5 anni



# Agenda

**PNRR MiTE: sintesi degli obiettivi e dello stato di attuazione**

**Focus Milestones e Targets UE: scadenze 2022**




# M&T UE già conseguite nel 2021

xx Miliardi di euro








Misura	M&T conseguita	Note (non esaustivo)
<b>C1 I 1.1; I1.2 – Nuovi impianti di gestione rifiuti ed ammodernamento esistenti; Progetti “faro” di economia circolare</b> 2,10	Approvazione del decreto ministeriale di approvazione dei criteri per la selezione dei progetti	 • <b>Bandi in corso</b> (proroga di un mese)
<b>C2 R 1.2- Nuova normativa per promuovere la produzione e il consumo di gas rinnovabile</b>	Entrata in vigore di un decreto legislativo teso a promuovere l'uso del biometano nei trasporti, nell'industria e nel settore residenziale	 • <b>DM attuativo</b> in corso di finalizzazione
<b>C3 I 2.1 - Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus</b> 13,95	Entrata in vigore della proroga del Superbonus	 • Introduzione di recente correttivo con aggiornamento <b>prezzi massimi</b>
<b>C4 I 1.1 - Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione</b> 0,50	Piano operativo per un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici	 • <b>Piano operativo</b> avviato; <b>bando</b> in corso di preparazione (modello <b>PPP</b> in corso di valutazione)
<b>C4 I 3.1 - Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano</b> 0,33	Adozione delle linee guida per il Piano di forestazione	 • <b>Avviso pubblico</b> (in corso di finalizzazione) sarà rivolto alle città metropolitane e verrà pubblicato entro la fine di febbraio
<b>C4 R 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati</b>	Riforma del quadro giuridico per una migliore gestione e un uso sostenibile dell'acqua	 • Norma primaria approvata che attiva un <b>processo di convergenza</b> verso gli standard di efficienza del servizio
<b>C4 R 3.1 - Adozione programmi nazionali di controllo inquinamento atmosferico</b>	Entrata in vigore di un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico	 • --

**7 M&T UE conseguite nel 2021**


# Focus M&T UE e ITA attese al T1 2022


 Nessuna criticità
  Elementi di attenzione non critici
  Elementi di attenzione rilevanti


Miliardi di euro

Misura	Prossimo M&T	Status (non esaustivo)	Principali elementi di attenzione
 <b>C4 I 3.2 Digitalizzazione dei parchi nazionali</b> <input type="text" value="0,10"/>	Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo dei servizi digitali, il DM deve prevedere lo sviluppo di servizi digitali per i visitatori	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabbisogni dei Parchi identificati (con ISPRA, per quanto riguarda linea monitoraggio)</li> <li>Specifiche per sviluppo servizi avviate (con SOGEI) anche comparando lavoro di altri Paesi</li> <li>Bozza DM pronta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chiarimento con MiTD su copertura rete 5G</li> </ul>
 <b>C4 I 3.3 Rinaturazione area Po</b> <input type="text" value="0,36"/>	Stesura del Programma d'azione: le autorità e le regioni del bacino preparano PO per l'attuazione del programma	 <ul style="list-style-type: none"> <li>AdP (che prevede Cabina di Regia) firmato e registrato</li> <li>Protocollo di intesa (che prevede Tavolo di lavoro e Cts) redatto, da sottoscrivere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protocollo d'intesa da sottoscrivere</li> </ul>
<b>C2 I 4.3 Infrastruttura di ricarica</b> <input type="text" value="0,74"/>	Emissione <b>avviso pubblico</b> per fornitura di cofinanziamenti per costruzione di IR (notifica dell'apertura del contatore per presentazione domanda)	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Attività tecnica in corso con RSE per finalizzare lo schema di decreto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>
<b>C1 R 1.1 Programma nazionale gestione rifiuti</b>	Preparazione del documento di <b>valutazione ambientale strategica</b> (pubblicazione del decreto VAS)	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Avviata la procedura di VAS. La prima fase di scoping è stata conclusa con l'acquisizione dei contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e del parere della Commissione tecnica VIA-VAS. In corso di redazione il Rapporto ambientale da sottoporre a consultazione pubblica per la conclusione della procedura di VAS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>
<b>C3 R 1.1 Efficienza energetica</b>	a) Lancio del <b>portale nazionale</b> per l'efficienza energetica degli edifici (prime funzionalità) ed e) <b>semplificazione</b> delle procedure ex-ante	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto istituzione portale predisposto e inviato MEF e MiTD per concertazione (input MiTD recepito, MEF in corso di interlocuzione)</li> <li>Avviato in parallelo stesura convenzione con Enea (stima avvio sviluppo portale ad aprile)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eventuale avvio attività con Enea anche in attesa finalizzazione formalizzazione convenzione</li> </ul>








# Focus M&T UE e ITA attese al T2 2022 (1/3)

 Nessuna criticità

 Elementi di attenzione non critici


 Elementi di attenzione rilevanti


xx Miliardi di euro


Misura	Prossimo M&T	Status	Principali elementi di attenzione
 <b>C1 – I 3.3 Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali</b> 0,03	Avvio della <b>piattaforma web e accordi</b> con gli autori (firma)	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Definita proposta e strumento per prima componente lezioni</li> <li>Scrittura capitolato tecnico in corso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Supporto specialistico</b> per finalizzazione capitolato e gestione procedura</li> </ul>
<b>C2 - I 3.5 Ricerca e sviluppo sull'idrogeno</b> 0,16	<b>Aggiudicazione di tutti i contratti di ricerca e sviluppo</b> a progetti di ricerca: sull'idrogeno (quattro filoni di ricerca)	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Piano di Ricerca approvato (Enea affidatario)</li> <li>Bozza AdP con Enea pronta</li> <li>Bozza bandi pronta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>
<b>C2 – I 5.2 Idrogeno</b> 0,45	<b>Produzione di elettrolizzatori:</b> aggiudicazione dell'appalto per costruire uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Interlocuzioni effettuate con associazioni e con MISE</li> <li>Avviato GdL con Invitalia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Coordinamento con altri strumenti</b> a disposizione</li> </ul>
<b>C3 – R 1.1 Efficienza energetica</b>	<b>Semplificazione e accelerazione delle procedure</b> per gli interventi di efficientamento energetico.	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Su a) ed e) riferimento T1</li> <li>Semplificazione già in vigore</li> <li>Riforma PREPAC pronta, necessaria norma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Necessaria <b>norma dedicata</b> per <b>emanazione riforma PREPAC</b> entro giugno</li> <li>Necessaria <b>norma dedicata</b> per <b>monitoraggio sismabonus</b></li> </ul>
<b>C1 – R 1.1 Strategia nazionale per l'economia circolare</b>	Entrata in vigore del <b>decreto ministeriale</b> per l'adozione della strategia nazionale per l'economia circolare	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Consultazione conclusa, sintesi dei contributi in corso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>
<b>C1 – R 1.2 Programma nazionale per la gestione dei rifiuti</b>	Entrata in vigore del <b>decreto ministeriale</b> per il programma nazionale di gestione dei rifiuti con inclusione almeno degli obiettivi indicati	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Avviata la procedura di VAS. La prima fase di scoping è stata conclusa con l'acquisizione dei contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e del parere della Commissione tecnica VIA-VAS. In corso di redazione il Rapporto ambientale da sottoporre a consultazione pubblica per la conclusione della procedura di VAS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>

Misure che richiedono intervento normativo









# Focus M&T UE e ITA attese al T2 2022 (2/3)

 Nessuna criticità


 Elementi di attenzione non critici


 Elementi di attenzione rilevanti


xx Miliardi di euro

Misura	Prossimo M&T	Status	Principali elementi di attenzione
 <b>C1 – R 1.3 Supporto tecnico alle autorità locali</b>	Approvazione dell' <b>accordo per lo sviluppo del piano d'azione</b> per la creazione di capacità a sostegno degli enti locali. Pubblicazione sul sito del Ministero dell'accordo approvato	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Riforma abilitante per M1 1.1 e 1.2, già in corso con Invitalia, Sogesid. Da rafforzare e stipulare potenziali ulteriori accordi</li> </ul>	-
<b>C2 - R 3.2 - Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno</b>	Entrata in vigore degli <b>incentivi fiscali</b> . La legge deve introdurre incentivi fiscali a sostegno della produzione di idrogeno verde e del consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti.	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Interlocazione avviata con MEF</li> <li>In parallelo, avviata anche con GSE disegno schema para-fiscalità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Approfondimento in corso con MEF</b> su possibili incentivi fiscali a consumo o a produzione</li> </ul>
<b>C4 – R 2.1 Semplificazione e accelerazione procedure per interventi contro dissesto idrogeologico</b>	Entrata in vigore della <b>semplificazione del quadro giuridico</b> per una migliore gestione dei rischi idrologici secondo i requisiti indicati		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica in corso di opportunità di <b>ulteriori provvedimenti</b> necessari</li> </ul>
<b>C4 – R 4.2 Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati</b>	Entrata in vigore del <b>nuovo quadro giuridico</b> relativo agli scopi irrigui secondo i requisiti indicati		
 <b>C2- I 3.1 Produzione di idrogeno in siti dismessi</b>	Procedura di presentazione delle domande per la creazione degli impianti di produzione e delle infrastrutture di utilizzo locali. Adozione di un decreto ministeriale con selezione dei <b>progetti da finanziare</b> .	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Manifestazione di interesse pubblicata</li> <li>Elaborazione DM Criteri di valutazione in corso, a seguire attesa risposta Regioni, DM Ripartizione fondi e acquisizione progetti</li> </ul>	-
<b>C2 – I 3.2 Utilizzo idrogeno in settori hard-to-abate</b>	Lanciare l' <b>invito a presentare proposte per i progetti</b> sull'uso dell'idrogeno nell'industria dell'hard-to-abate. Pubblicazione del decreto attuativo per identificare i progetti che possono essere finanziati	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Interlocazioni effettuate con possibili destinatari e con MiSE</li> <li>Avviato GdL con Invitalia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tempi di <b>potenziale notifica</b> della misura</li> </ul>








# Focus M&T UE e ITA attese al T2 2022 (3/3)

 Nessuna criticità

 Elementi di attenzione non critici

 Elementi di attenzione rilevanti

 Miliardi di euro

Misura	Prossimo M&T	Status	Principali elementi di attenzione
 <b>C3 – I 3.1 Promozione di un teleriscaldamento efficiente</b> <input type="text" value="0,20"/>	Emissione del bando relativo alla costruzione di nuove reti o all'estensione di reti di teleriscaldamento esistenti	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Effettuata ricognizione esigenze e incontro con operatori (secondo previsto a febbraio)</li> <li>Stesura bando in corso</li> </ul>	-
<b>C4 - I 3.5 Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini</b> <input type="text" value="0,40"/>	Percentuale di mappatura degli habitat marini e costieri	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Convenzione e studio con ISPRA su habitat marini e specie target mappabili</li> <li>Convenzione con SM Marina Militare per acquisto nave</li> </ul>	Attività di mappatura per giugno probabile <b>tramite attività ordinarie</b>
<b>C2- I 1.1 Porti verdi</b> <input type="text" value="0,27"/>	Numero di Autorità Portuali che completano il disegno di fattibilità di ogni progetto integrato sulla base dei DEASP (porti verdi)	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Gara in corso</li> </ul>	Approfondimento in corso su problematiche relative ad <b>Aiuti di Stato</b>
<b>C3 - R 1.1.c Aggiornare e rafforzare il Fondo nazionale per l'efficienza energetica</b>	Riforma del fondo nazionale per l'efficienza energetica. Pubblicazione di un <b>decreto di riforma</b> di tale fondo	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Approvato emendamento che consente erogazione anche di contributi a fondo perduto</li> <li>Stesura del decreto di riforma in corso</li> </ul>	-
<b>C3 – R 1.1.d Accelerare la fase di attuazione dei progetti finanziati dal programma PREPAC</b>	Riforma PREPAC	 <ul style="list-style-type: none"> <li>(come riportato in scadenza europea)</li> </ul>	-
<b>C3 – R 1.1.g Gestione dei rifiuti di costruzione secondo i principi dell'economia circolare</b>	Gestione dei rifiuti di costruzione. Approvazione del <b>decreto ministeriale</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Schema di decreto sottoposto al Consiglio di Stato – pervenuto parere – nuovo testo al vaglio Ufficio Legislativo</li> </ul>	-

# Sintesi ulteriori M&T UE attese in T3/T4 2022

Misura	Prossimo M&T
<b>C1 I 3.1 Isole verdi</b> 0,20	Entrata in vigore <b>del decreto direttoriale</b> che deve approvare la <b>graduatoria dei progetti</b> relativa ai risultati del bando. La procedura di selezione deve includere elementi specifici
<b>C4 R 4.2 Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati</b>	Entrata in vigore della <b>riforma</b> volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati, nel rispetto di specifici requisiti
<b>M1 C3 – R 3.1: Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali</b>	Entrata in vigore di un <b>decreto</b> che stabilisca i criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici per eventi culturali finanziati con fondi pubblici
<b>C2 - I 2.1: Rafforzamento smart grid</b> 3,61	Aggiudicazione di (tutti gli) <b>appalti pubblici</b> per l'aumento della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile e l'elettificazione dei consumi energetici
<b>C2 - I 2.2: Interventi su resilienza climatica reti</b> 0,50	<b>Aggiudicazione progetti</b> per migliorare la resilienza della rete del sistema elettrico al fine di ridurre frequenza e durata delle interruzioni della fornitura dovute a condizioni meteorologiche estreme
<b>C3 – I 3.1 Promozione teleriscaldamento efficiente</b> 0,20	Aggiudicazione di tutti gli <b>appalti pubblici</b> per la costruzione di nuove reti di teleriscaldamento o l'ampliamento di quelle esistenti, che dovrebbero includere l'obbligo di ridurre il consumo energetico

Misura	Prossimo M&T
<b>C4 – I 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano</b> 0,33	<b>Piantumazione di alberi</b> (almeno 1 650 000) per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane
<b>C4 – I 3.4 Bonifica del suolo dei siti orfani</b> 0,50	<b>Adozione del piano d'azione</b> per la riqualificazione dei siti orfani Deve includere come minimo:- l'individuazione di siti orfani in tutte le 20 regioni e/o le province autonome; - gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano
<b>M3 C2 - I 1.1 Porti verdi</b> 0,27	<b>Aggiudicazione</b> di opere alle Autorità di sistema portuale.

**Ulteriori 9 M&T UE nel corso del II semestre '22**

# Rafforzamento del coinvolgimento di tutti gli stakeholder, della comunicazione, e dell'assistenza tecnica sulle misure PNRR MiTE



Avvio a breve del reclutamento di più di **100** tra esperti e project manager per misure PNRR
